

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE  
**WILAYA DE GUELMA**

DAIRA DE AIN HASSAINIA

COMMUNE DE HOUARI BOUMEDIENNE

PROJET ETUDE ET SUIVI D UN GROUPE SCOLAIRE TYPE C

Et

Logements D astreinte à GUELMA

MAITRE D OUVRAGE DEP

GUELMA

RAPORT MENTUEL DE SUIVI

JUIN 2018

Alaoui Djamel ARCHIRECTE AGREE  
INSCRIT AU TABLEAU NATIONAL DE L' ORDRE DES ARCHITECTES  
SOUS LE NUMERO 00221/24/96 L  
CITE CHAMPS MANŒUVRES BT 14 N° 04 GUELMA

**LOT N° 01 : BLOC PEDAGOGIQUE + ADMINISTRATION**  
**ENTREPRISE : CHEMAKHI BADRE DINE**  
**MARCHE N° 14/2018 DU 04-04-2018 MONTANT : 44.507.366 ,60 DA**  
**ODS : 24/2018- DU 13-05-2018**  
**DELAIS : 12 MOIS**

## **RAPORT DE SUIVI JUIN 2018**

**I-Rappel Des Travaux Réalisés Durant Le Mois De Mai 2018** : Durant le mois de mai 2018, l'ETB CHEMAKHI BADRE DINE, chargée de réaliser le lot n° 01 à savoir **BLOC PEDAGOGIQUE + ADMINISTRATION**, a été installée, a implémenté le projet, a nettoyé le terrain qui contenait des tas de débris provenant d'autres chantiers Et a entamé les travaux de terrassement en grande masse et en puits, les travaux de terrassement en grande masse et en puits ont été achevés durant ce mois de mai

### **II- Travaux Réalisés Durant Le Mois De JUIN 2018 :-**

Durant le mois de juin 2018, l'ETB a coulé le béton de propreté sous semelles, a entamé le coffrage et ferrailage des semelles, amorce de poteaux et voiles périphérique, a coulé les semelles du joints 02



Le taux d'avancement est satisfaisant, on peut l'estimer à **15 %**, alors que le délai est de 01 mois et demi soit **12%**.

Les paiements : **NEANT**

LOT N° 02 : BLOC D ASTREINTE+ V R D

ENTREPRISE : SAIB ABDELMADJID


MARCHE N° 13/2018 DU 12-04-2018 MONTANT : 20.307.481 ,61 DA

ODS : 24/2018- DU 13-05-2018

DELAIS :11 MOIS

**I-Rappel Des Travaux Réalisés Durant Le Mois De Mai 2018** : Durant le mois de mai 2018, l'ETB SAIB ABDELMADJID , chargée de réaliser le lot n° 02 à savoir **BLOC D ASTREINTE+ V R D**, a été installée, a implanté le projet, a nettoyé le terrain qui contenait des tas de débris provenant d'autres chantiers .Et a entamé les travaux de terrassement en grande masse et en puits ainsi le coulage du béton de propreté sous Semelles .Et a achevé les travaux de terrassement ainsi le coulage du béton de propreté sous Semelles et a entamé le ferrailage le coffrage des semelles.

**II- Travaux Réalisés Durant Le Mois De JUIN 2018** : Durant le mois de juin l'ETB et a achevé le ferrailage le coffrage ainsi que le coulage des semelles. Et a entamé le ferrailage et le coffrage des amorces de poteaux et voiles périphérique.

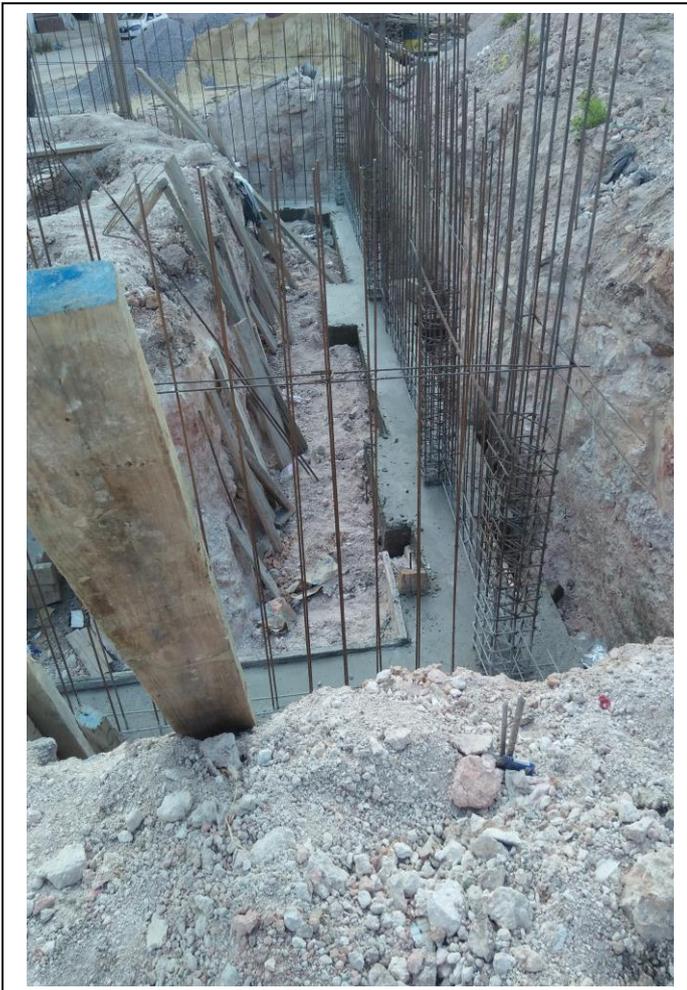

Le taux d'avancement est satisfaisant, on peut l'estimer à **16 %**, alors que le délai est de 01 mois et demi soit **12%**.

Les paiements : **NEANT**
